Enunciado: El señor E es un antiguo y respetado abogado de la ciudad de Valdivia, y trabaja con otros colegas en una firma llamada "Viejitos pero con Corazón". Generalmente cuando llegan clientes (si es que llegan) el abogado que se encuentre disponible anota en documentos en su computador o a mano la causa del cliente y la información de contacto, aunque a veces se confunden por el nombre del archivo o se le pierden. También existen oportunidades en las que se cede una causa a otro abogado, por lo que debe traspasar toda la información de la causa (documentos en papel y digitales) y del contacto del cliente.

La firma en conjunto designó al señor E como encargado para buscar una solución a sus problemas, el cual, decidió contratarte por tus nuevos conocimientos adquiridos en desarrollo de proyectos.

A realizar

- 1. Escoger un modelo para el proceso de desarrollo, justificando el porque (considere la dificultad y el contexto).
- 2.Suponga que cuenta con un equipo de 3 personas para el desarrollo del proyecto, defina roles y describa labores generales (tu .
- 3.Interpretar y documentar a grandes rasgos los requisitos funcionales y no funcionales del desafío. propuesto.
- 4. Utilizar al menos una vez una técnica para la obtención/descripción de requisitos.

Entregable: Un archivo pdf (o un link) con el formato NOMBRE_PROYECTO-APELLIDO que incluya los 4 puntos mencionados, mínimo 2 páginas.

1.- Para el desarrollo del proyecto mencionaré el Modelo en V, variación de cascada pero con objetivo de "Verificación y Validación" en sus etapas, mencionando además que es un proyecto pequeño con los requisitos objetivamente bien definidos, y con capacidad de trabajo de 3 personas, permitiendo además una fuerte dimensión del problema aceptada en cada etapa con la documentación.

Fuente: https://jummp.wordpress.com/2011/09/06/desarrollo-de-software-testing-modelo-en-v/


2.- Roles del equipo:


Comprendiendo que para éstos casos en el proceso de desarrollo del proyecto todos poseen habilidades de desarrolladores, cual potencia el proceso productivo de la entrega final además de otras tareas que son primordiales en las negociaciones con el cliente.

- Relacionador público/Interlocutor: Que permite tomar directa relación con el cliente para la toma de requisitos y negociación sobre la validación y verificación de los recursos a usar en las fases de desarrollo del proyecto.
- Intérprete: Permite abordar y representar los procesos de documentación, modelado, pre-diseño para caracterizar de forma gráfica los requisitos tomados a través del cliente, entregando una rápida muestra prototipada funcional y no funcional al cliente.
- Calidad/Mediador: Permite verificar la consistencia de lo que se desarrolla o interpreta, creando coherencia con lo relatado v/s lo documentado. Permite además ya tener una pre evaluación de lo que se requiere de manera ordenada y clara.
- 3.- Requisitos Funcionales y No funcionales.
 - Requisitos Funcionales
 - Registro del/los caso/s
 - Registro de Contacto
 - Registro abogado patrocinante

- Requisitos no Funcionales
 - Distribución de causas según disponibilidad de abogados
 - Asignación de casos según especialidad de abogados

4.-

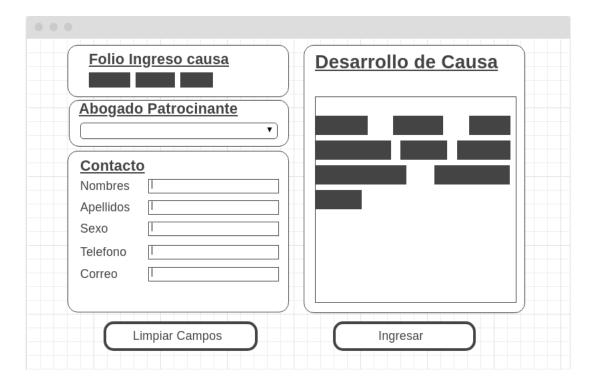



Horas hombre del proyecto	400
Horas totales por persona (HTP)	133,3333333
Horas trabajadas por dia	2,5
Dias trabajados en la semana	5
HTP/NS (Numero de horas en una semana por persona)	12,5
Total de semanas del proyecto	12

Tareas	Duración	Inicio
Incremento 1	4 semanas	24-jun
Incremento 2	4 semanas	22-jul
Incremento 3	4 semanas	19-ago

Horas 12,5 12,5

	Julio	
	Intervalo (Dias)	Horas
2	01 a 05	12,5
3	08 a 12	12,5
4	15 a 19	12,5
5	22 a 27	12,5
6	29 a 02/08	12,5
	Total	75

	Agosto	
	Intervalo (Dias)	Horas
7	05 a 09	12,5
8	12 a 16	12,5
9	19 a 23	12,5
10	26 a 30	12,5
	Total	112,5

Fin 19-jul 16-ago 13-sep

S	eptimbre	
1	ntervalo (Dias)	Horas
11	02 a 06	12,5
12	09 a 13	12,5
T	otal	137,5

Carta Gantt: Nombre del Proyecto

Fecha de inicio: 24-06-19 Fecha de término: 13-09-19

	recha de termino: 13-09-19				
	Tareas	Responsables (Rol)			
_	Incremento 1: Registro del caso				
ValidacióNerificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor			
g	Analisis del Sistema	Interprete			
įįį	Diseño del Software	Interprete			
/er	Diseño de Módulos	Calidad			
Óħ	Prueba Unitaria	Interlocutor			
aci	Prueba de Integración	Interprete			
<u>i</u>	Prueba de Sistema	Calidad			
۷a	Prueba de Validación	Interlocutor			
	Entregable 1	Calidad			
_	Incremento 2: Registro de Contacto				
ValidacióNerificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor			
g	Analisis del Sistema	Interprete			
įįį	Diseño del Software	Interprete			
/er	Diseño de Módulos	Calidad			
Óħ	Prueba Unitaria	Interlocutor			
aci	Prueba de Integración	Interprete			
<u>p</u>	Prueba de Sistema	Calidad			
ζa	Prueba de Validación	Interlocutor			
	Entregable 2	Calidad			
_	Incremento 3: Enlace Abogado Patrocinante				
ValidacióNerificación	Requisitos del Sistema	Interlocutor			
g	Analisis del Sistema	Interprete			
ij	Diseño del Software	Interprete			
/er	Diseño de Módulos	Calidad			
ión	Prueba Unitaria	Interlocutor			
ac	Prueba de Integración	Interprete			
<u> </u>	Prueba de Sistema	Calidad			
۸	Prueba de Validación	Interlocutor			
	Entregable 3	Calidad			

Se	mana 1				S	emana 2	2	
24-jun ###	26-jun	27-jun	28-jun	01-jul	02-jul	03-jul	04-jul	05-jul
								Increm

	Semana 3 09-jul 10-jul 11-jul 12-				S	emana 4			
08-jul	09-jul	10-jul	11-jul	12-jul	15-jul	16-jul	17-jul	18-jul	19-jul
nento 1									

	S	Semana 5				S	emana	6	
22-iul	23-iul	24-iul	25-iul	26-iul	29-iul	30-iul	31-iul	01-ago	02-ago

Increm

	9	Semana '	7		Semana 8				
05-ago	06-ago	07-ago	08-ago	09-ago	12-ago	13-ago	14-ago	15-ago	16-ago

ento 2

Semana 9 19-ago 20-ago 21-ago 22-ago 23-ag			Semana 10						
19-ago	20-ago	21-ago	22-ago	23-ago	26-ago	27-ago	28-ago	29-ago	30-ago

Increm

	5	Semana 🛚	11			5	Semana 🛚	12	
02-sep	03-sep	04-sep	05-sep	06-sep	09-sep	10-sep	11-sep	12-sep	13-sep


ento 3

Proyecto Señor E.

Del presente documento se realizará una entrega de requisitos tecnológicos, para el desarrollo del proyecto en cuestión, tomando en cuenta las herramientas a utilizar durante el proceso planificado.

Arquitectura:

Se presenta un modelo esquemático de tipo MVC (Modelo Vista Controlador) que permite saber y determinar las tecnologías a usar durante el proceso de desarrollo, lo cual sabremos el tipo de interacciones a nivel general la serie de instrucciones para ejecución de procedimientos, interacciones para entornos visuales con el usuario y el como opera el sistema de almacenamiento.

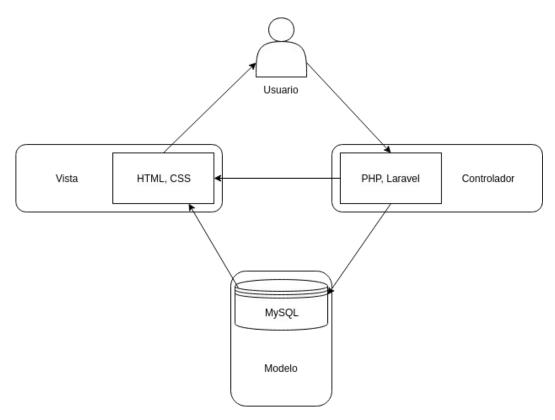

Framework a usar:

Laravel, debido que trabaja bajo el entorno MVC, junto con las herramientas mencionadas dentro del patrón a utilizar para el desarrollo, mencionando ademas experiencia en el desarrollo con dicho framework

Sección de Pruebas y IC

Listado de pruebas funcionales

Prueba de desarrollo:

Título: Prueba de acceso a la Aplicación

Herramienta a utilizar: PHP Junit Laravel

Prueba de Versión:

Tílulo: Prueba de usabilidad

Herramienta a utilizar: Heurística de Neilsen para escenario con personas

Prueba de Usuario:

Título: Prueba de funcionalidad y entendimiento

Herramienta a utilizar: Co-Descubrimiento con experiencia de monitoreo.

Herramienta de Integración continua:

Para el proyecto será necesario usar la herramienta github para el almacenamiento y gestión de versiones del sistema, por usar un framework basado en PHP, no necesita compilación o procesos "Build" ya que para el desarrollo los procedimientos ocurren en el mismo instante.

En casos donde necesitemos ver progresos de estado del desarrollo ocuparemos Jenkins, que nos permite monitorear además de mantener un respaldo del VCS conjuntamente al desarrollo. Si bien ésta herramienta está basada en Java y complementaria al Framework, si podría permitir automatizacion de tareas calendarizadas y monitorear su ejecución mediante scripts de "testing" necesarios para saber si cumplen aún con los requisitos globales por ejemplo.

Fuente Jenkins: https://es.wikipedia.org/wiki/Jenkins#Explicaciones de una linea
